




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

N 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
da_pessel@gmail.com

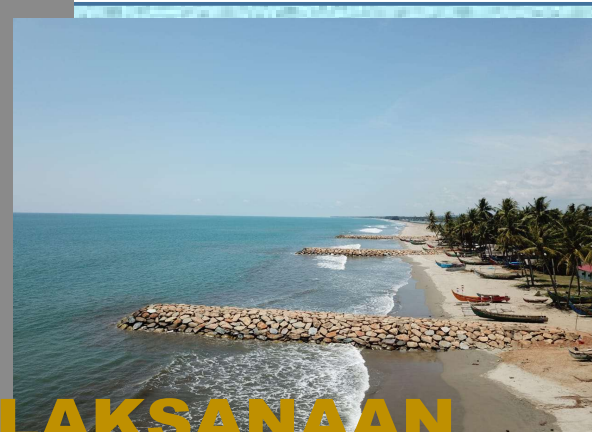

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN



BULAN APRIL 2 020

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN APRIL 2020

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		41.000.000	-	41.000.000										
I. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		41.000.000	-	41.000.000	FERI CANDRA, S.Kom						-	-	-	
	1 Pengukuran Debit Sungai	40.000.000	-	40.000.000			1 Unit	IV Jurai		PL			-	
	2 Biaya Penunjang	1.000.000	-	1.000.000						Swk			-	
B. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		2.865.389.940	1.423.309.000	1.442.080.940										
I Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Pembuangan		169.732.940	-	169.732.940	ANHAVON, ST						-	2,50	12,50	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	160.000.000	-	160.000.000			1 Pkt	Tersebar		Swk		5,00	15,00	
	2 Biaya Penunjang	9.732.940	-	9.732.940						Swk			10,00	
II. Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan		2.695.657.000	1.423.309.000	1.272.348.000	ANHAVON, ST						2,80	32,63	49,17	
	1 Pembangunan Drainase Kampung Limau Sundai Taratak Panas Pelangai Gadang	380.000.000		380.000.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		Tender			-	
	2 Pembangunan Drainase Saluran Primer Teluk Kualo	191.000.000	189.746.000	1.254.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Air Pura	CV HADI PRATAMA	PL	5,00	75,00	100,00	
	3 Pembangunan Drainase Sianik	191.000.000	189.719.000	1.281.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	IV Jurai	CV SAUDA ANGGUN SARI	PL	5,00	36,85	75,00	
	4 Pembangunan Drainase Pasar Inpres Batang Kapas	677.000.000		677.000.000			1 Pkt	Batang Kapas		Tender			-	
	5 Pembangunan Drainase Sekitar Rumah Dinas Camat Rahul	191.000.000	189.500.000	1.500.000		04-04 s/d 02-07-20	1 Pkt	Ranah Ampek Hulu	CV. ARA ABADI	PL		10,00	10,00	
	6 Pembangunan Drainase Kampung Pasa Malintang Nagari Inderapura Tengah	189.300.000	187.974.000	1.326.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. RAHMA KARYA	PL	5,00	45,00	75,00	
	7 Pembangunan Drainase Perumahan Painan Timur (Lanjutan)	195.600.000	194.268.000	1.332.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. JAVA ANDALAS	PL	5,00	80,25	100,00	
	8 Pembangunan Drainase Pasar Lama	191.000.000	189.759.000	1.241.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	5,00	15,00	50,00	
	9 Pembangunan Drainase Kampung Tengah Simpang Gurun Panjang Utara	142.200.000	141.191.000	1.009.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang	CV AFFAN JAYA	PL		30,00	50,00	
	10 Pembangunan Drainase Seberang Galundi Surau Anjung Tarusan	100.000.000		100.000.000			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL			-	
	11 Pembangunan Drainase Balah Rambahan Nagari Pungasan	142.200.000	141.152.000	1.048.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. BINTANG SELATAN	PL	5,00	95,87	100,00	
	12 Biaya Penunjang	105.357.000	-	105.357.000						Swk	3,60	3,60	30,00	
		-												
C. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IIRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA		29.659.343.630	5.656.232.403	24.003.111.227										
I Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai		2.638.280.000	2.112.528.000	525.752.000	PUSRIAL, ST						4,50	47,44	74,06	
	1 Normalisasi Sungai Batang Lunang	189.000.000	187.927.000	1.073.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lunang	CV. TALANG BALIRIK	PL	5,00	32,00	50,00	
	2 Normalisasi Saluran Koto Pandan - Sawah Bukik	189.000.000	187.925.000	1.075.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Air Pura	CV. FUJUTA	PL	5,00	-	50,00	
	3 Normalisasi Saluran Sungai Kuyung Lunang Utara	189.000.000	188.124.000	876.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lunang	CV. HADY PRATAMA	PL	5,00	75,00	100,00	
	4 Normalisasi Saluran Rawang Tobl Pasar Suranth	189.000.000	188.050.000	950.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. OCY	PL	5,00	75,00	100,00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Amping Parak	189.600.000	188.608.000	992.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Sutera	CV. ELECTRA GEMILANG	PL	5,00	80,00	100,00	
	6 Normalisasi Saluran Sungai Padang Panjang I Kambang Utara	189.800.000	188.500.000	1.300.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	PL	5,00	75,00	100,00	
	7 Normalisasi Saluran Sungai Kampung Tanjung Kandise Nagari Taluak Tigo Sakato Batang Kapas	141.000.000	139.924.000	1.076.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	PL	5,00	-	50,00	
	8 Normalisasi Sungai Batang Sei Durian	142.500.000	141.839.000	661.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. HAMZA PUTRA	PL	5,00	65,00	100,00	
	9 Normalisasi Sungai Batang Malepang	142.500.000	141.307.000	1.193.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. HAMZA PUTRA	PL	5,00	70,00	100,00	
	10 Normalisasi Sungai Batang Jalamu	200.000.000	-	200.000.000			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
	11 Normalisasi Saluran Rimbo Panjang Nag. Tigo Sungai Inderapura	142.500.000	141.260.000	1.240.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Air Pura	CV. PUTRA SIKUMBANG	PL	5,00	65,00	100,00	
	12 Normalisasi Sungai Batang Panambam	93.500.000	92.850.000	650.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. PUTRA SIKUMBANG	PL	5,00	15,00	50,00	
	13 Normalisasi Sungai Nagari Air Haji Tengah	93.500.000	92.462.000	1.038.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. JAYA CONVIDENCE	PL	5,00	25,00	50,00	
	14 Cuci parit kp. Talaut Nag. Muaro Kec. Pancung Soal	45.000.000	44.630.000	370.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZAHRA KARYA	PL	5,00	95,00	100,00	
	15 Normalisasi sungai Pinang Sabatang	191.000.000	189.122.000	1.878.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. ARA ABADI	PL	5,00	85,00	100,00	
	16 Biaya Penunjang	311.380.000	-	311.380.000						Swk	2,00	2,00	35,00	
II Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi		2.598.813.980	1.701.449.980	897.364.000	AGUSMAN, ST						1,78	24,67	52,50	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Ketaping	188.000.000	187.091.000	909.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Ranah Ampek Hulu	CV. ZEIN KARYA	PL		30,53	60,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Kubu	188.000.000	187.422.000	578.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Ranah Ampek Hulu	CV. ATTAM KARYA	PL		30,18	60,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tanjung Kandise	188.000.000	187.236.000	764.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. ALBI SUKSES MANDIRI	PL	5,00	30,42	60,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Titi Patai	94.000.000	-	94.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL			30,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas	188.000.000	187.353.000	647.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAVA ANDALAS	PL	5,00	42,99	60,00	
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Limau Manih	188.000.000	187.314.000	686.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Lengayang	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA	PL	5,00	44,30	60,00	
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bayang Bungo	188.000.000	187.178.000	822.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Bayang	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA	PL	5,00	30,69	60,00	
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Balank	540.000.000	-	540.000.000			1 Pkt	Basa IV Balai		Tender			30,00	
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Sumua	188.000.000	187.341.000	659.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. RAYBIL JAYA	PL		30,12	60,00	
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lauk Kurao	188.000.000	187.321.000	679.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BATANG TARUSAN PERDANA	PL		30,20	60,00	
11	Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Baru Batang Kapas	100.000.000	-	100.000.000			1 Pkt	Batang Kapas		PL			30,00	
12	Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Berok Gurun Panjang	150.000.000	-	150.000.000			1 Pkt	Bayang		PL			30,00	
13	Rehab Saluran Irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kecamatan Lengayang	115.000.000	107.380.000	7.620.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Lengayang	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	PL		35,10	60,00	
14	Biaya Penunjang	95.813.980	95.813.980	-						Swk	4,93	40,89	75,00	
	III Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	6.656.462.000	13.047.980	6.643.414.020	JOKO PRIHANTORO, ST						0,47	0,47	0,47	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Tanah Kareh	300.000.000	-	300.000.000			1 Pkt	Batang Kapas		Tender			-	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tabek Sampudiang	1.200.000.000	-	1.200.000.000			1 Pkt	Sutera		Tender			-	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aua	1.701.500.000	-	1.701.500.000			1 Pkt	Bayang		Tender			-	
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Air Nikek	1.108.700.000	-	1.108.700.000			1 Pkt	Basa Ampek Balai		Tender			-	
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ambacang	400.000.000	-	400.000.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			-	
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Panjang	750.000.000	-	750.000.000			1 Pkt	Sutera		Tender			-	
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang	736.431.000	-	736.431.000			1 Pkt	IV Jurai		Tender			-	
8	Pengawas Kegiatan DAK	150.000.000	-	150.000.000			1 Pkt	Tersebar berdasarkan Fisik		Tender			-	
9	Biaya Penunjang	309.831.000	13.047.980	296.783.020						Swk	4,21	4,21	4,21	
	IV Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	780.200.000	729.875.000	50.325.000	JOKO PRIHANTORO, ST						6,54	14,71	30,00	
1	OP Daerah Irigasi	730.000.000	729.875.000	125.000		27-03 s/d 20-09-20	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pessel	Swk		11,50	30,00	
2	Biaya Penunjang	50.200.000	-	50.200.000						Swk	13,09	17,91	30,00	
	V Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program	16.431.316.650	570.627.443	15.860.689.207	SUHERMAN, ST						21,88	23,01	30,56	
	(IPDMIP) (LOAN)													
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Agung	4.569.100.000	-	4.569.100.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			10,00	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah	4.569.100.000	-	4.569.100.000			1 Pkt	Lunang		Tender			10,00	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora	4.569.100.000	-	4.569.100.000			1 Pkt	Batang Kapas		Tender			10,00	
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II	538.785.207	-	538.785.207			1 Pkt	IV Jurai		Tender			10,00	
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian	365.280.000	-	365.280.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			10,00	
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian	593.227.000	-	593.227.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		Tender			10,00	
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2019	437.731.703	437.731.703	-		16-09-19 s/d 23-03-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV BUKIT LANGKISAU	Lanjutan 2019	95,00	100,00	100,00	
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II (2019)	132.895.740	132.895.740	-		16-09-19 s/d 12-02-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. RHANIYA	Lanjutan 2019	95,00	100,00	100,00	
9	Biaya Penunjang	666.097.000	-	666.097.000						Swk	6,89	7,05	15,00	
	VI Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	554.271.000	528.704.000	25.567.000	HARIS, ST						90,07	90,97	100,00	
1	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sarasah Sungai Tunu dan D.I Sarasah Sungai Putih	97.000.000	96.684.500	315.500		29-01 s/d 13-03-20	1 Pkt	Koto XI Tarusan & Bayang	CV. PILARINDO 2010	PL	100,00	100,00	100,00	
2	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sianik, D.I Koto Rawang dan D.I Sungai Beremas Ampuan	95.500.000	95.293.000	207.000		29-01 s/d 13-03-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. BALAD INTI SEMESTA	PL	100,00	100,00	100,00	
3	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tanjung Kandih dan D.I Koto Panjang	100.000.000	99.797.500	202.500		29-01 s/d 13-03-20	1 Pkt	Sutera & Lengayang	PT. NEBULA GHEINDO CONSULTANT	PL	100,00	100,00	100,00	
4	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sungai Gemuruh dan D.I Damar Rumpot	100.000.000	99.346.500	653.500		11-02 s/d 26-03-20	1 Pkt	Pancung Soal & Air Pura	CV. MARCHINDO CONSULTANT	PL	100,00	100,00	100,00	
5	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Koto Panjang, D.I Tabek Koto Panjang dan D.I Kapalo Banda	88.500.000	88.324.500	175.500		11-02 s/d 26-03-20	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. AZZAHRA CONSULTANT	PL	100,00	100,00	100,00	
6	Reviu DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket A	50.000.000	49.258.000	742.000		26-02 s/d 26-03-20	1 Pkt	Tersebar	CV. MEDITAMA ENGINEERING CONSULTANT	PL	100,00	100,00	100,00	
7	Biaya Penunjang	23.271.000	-	23.271.000						Swk	30,51	36,81	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	387.675.350	197.950.000	189.725.350										
	I. Penyusunan Dokumen Lingkungan	165.353.350	-	165.353.350	YUSVIANITY, ST, M.Si						1,05	1,54	1,67	
	1 SPPL Embung Bayang Sani	10.300.000	-	10.300.000			1 Pkt	Bayang		PL				
	2 SPPL Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	46.072.000	-	46.072.000			1 Pkt	Tersebar		PL				
	3 LPPL D.I Sawah Laweh Batang Tarusan Semester I	30.000.000	-	30.000.000			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	4 LPPL Pembangunan Pengamanan Pantai Muaro Kandih Punggasan Semester I	30.000.000	-	30.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	5 LPPL Pembangunan Pengamanan Pantai Ampiang Parak Semester I	30.000.000	-	30.000.000			1 Pkt	Sulera		PL				
	6 Biaya Penunjang	18.981.350	-	18.981.350						Swk	6,30	9,23	10,00	
	II. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya	222.322.000	197.950.000	24.372.000	NASIRWAN,SH,ST,M.Hum						5,77	26,23	43,33	
	1 SID Embung Solok Sei. Nyalo	100.000.000	98.900.000	1.100.000		30-03 s/d 28-05-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. PILARINDO 2010	PL	2,00	30,00	50,00	
	2 SID Embung Sei. Tunu Utara	100.000.000	99.050.000	950.000		30-03 s/d 28-05-20	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BALAD INTI SEMESTA	PL	2,00	30,00	50,00	
	3 Biaya Penunjang	22.322.000	-	22.322.000						Swk	13,30	18,68	30,00	
		-												
E.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	3.958.689.400	1.590.544.000	2.368.145.400										
	I. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	3.136.912.400	1.590.544.000	1.546.368.400	BOY OF SUDARMAN, ST						3,00	36,13	47,19	
	1 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Pasar Gombang	470.875.000	-	470.875.000			1 Pkt	Lengayang		Tender				
	2 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sikuai	191.000.000	189.640.000	1.360.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang	CV. NAOMIMO	PL	5,00	40,00	30,00	
	3 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Medan Baik	385.000.000	-	385.000.000			1 Pkt	Lengayang		Tender				
	4 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Salido (Bungo Pasang I)	420.000.000	-	420.000.000			1 Pkt	IV Jurai		Tender				
	5 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Pasir Laweh Taratak Tangah Lumpo IV Jurai	142.250.000	141.680.000	570.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. AIKO PRATAMA. E	PL	5,00	40,00	75,00	
	6 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Mesjid Aqsa	185.000.000	183.836.000	1.164.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. BATANG LENGAYANG	PL	5,00	60,00	75,00	
	7 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Tajung Gadang Belakang Mesjid Nurul Islam	190.000.000	188.691.000	1.309.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Sulera	CV. HADI PRATAMA	PL	5,00	60,00	75,00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Surau Pasir Lubuk Nyiur (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	7.005.300	-	7.005.300			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
	9 Pengamanan Tebing Sungai Surau Tuik (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	6.992.100	-	6.992.100			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
	10 Pengamanan Tebing Sungai Koto Ranah	200.000.000	190.640.000	9.360.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang Utara	CV. MATA AIR	PL	5,00	100,00	100,00	
	11 Pengamanan Tebing Sungai Muaro Air	200.000.000	190.480.000	9.520.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang Utara	CV. MATA AIR	PL	5,00	100,00	100,00	
	12 Pengamanan Tebing Sungai Palo Koto Lubuk Sarik	189.000.000		189.000.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	13 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Tanjung Durian Nagari Sungai Tunu Utara	189.000.000	187.691.000	1.309.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. TEKNO ABADI	PL	5,00	60,00	75,00	
	14 Pengamanan Tebing Sungai Kambang Timur	128.000.000	126.986.000	1.014.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lengayang	CV. RAZY KAMCA	PL	5,00	70,00	100,00	
	15 Pengamanan Tebing Sungai Batang Lumpo Kp. Sungai Gayo Kec. IV Jurai	191.950.000	190.900.000	1.050.000		04-04 s/d 02-07-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. M.K CONTRACTOR	PL		40,00	75,00	
	16 Biaya Penunjang	40.840.000	-	40.840.000						Swk	8,00	8,00	50,00	
	II. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	436.125.000	-	436.125.000	BOY OF SUDARMAN, ST						24,50	49,50	75,00	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali Wilayah I-VII	426.139.830	-	426.139.830			1 Pkt	Tersebar		Swk		50,00	75,00	
	2 Biaya Penunjang	9.985.170	-	9.985.170						Swk	49,00	49,00	75,00	
	III Perencanaan Pengamanan Muara dan Pantai	385.652.000	-	385.652.000	NASIRWAN,SH,ST,M.Hum						0,84	0,84	0,84	
	1 DED Pengamanan Muara dan Pantai Karang Labuak Lakitan Utara	377.000.000	-	377.000.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			-	Batal
	2 Biaya Penunjang	8.652.000	-	8.652.000						Swk	1,67	1,67	1,67	
	J U M L A H	36.912.098.320	8.868.035.403	28.044.062.917			88 Pkt				11,66	25,04	36,95	

Painan, 04 Mei 2020

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KEADAAN BULAN APRIL 2020

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH DANA SETELAH PERGESERAN	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	878.854.262	646.051.650		221.553.226	221.553.226					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.800.000	70.800.000	FERI CANDRA, S.Kom	15.321.026	15.321.026	21,64	21,64	21,64	41,67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.800.000	70.800.000		15.321.026	15.321.026					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	335.222.500	335.222.500	NOFRIYENTI, S.Sos	75.500.000	75.500.000	22,52	22,52	22,52	41,67	
	a. Belanja Pegawai	333.600.000	333.600.000		75.500.000	75.500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.622.500	1.622.500		-	-					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46.989.000	34.989.000	NOFRIYENTI, S.Sos	10.693.500	10.693.500	30,56	30,56	30,56	41,67	
	a. Belanja Pegawai	36.000.000	24.000.000		6.000.000	6.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.989.000	10.989.000		4.693.500	4.693.500					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.700.000	14.700.000	FERI CANDRA, S.Kom	7.350.000	7.350.000	50,00	50,00	50,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.700.000	14.700.000		7.350.000	7.350.000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.095.900	48.095.900	FERI CANDRA, S.Kom	35.010.450	35.010.450	72,79	72,79	72,79	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	58.095.900	48.095.900		35.010.450	35.010.450					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.160.000	22.160.000	FERI CANDRA, S.Kom	8.247.500	8.247.500	37,22	37,22	37,22	41,67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.160.000	22.160.000		8.247.500	8.247.500					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.550.000	24.550.000	ZETLIARDO, SE	21.689.000	21.689.000	88,35	84,48	88,35	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	24.550.000	24.550.000		21.689.000	21.689.000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000	8.500.000	NOFRIYENTI, S.Sos	5.435.000	5.435.000	63,94	35,32	63,94	75,00	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	9.500.000	8.500.000		5.435.000	5.435.000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	63.525.000	43.525.000	ZETLIARDO, SE	6.847.500	6.847.500	15,73	7,75	15,73	41,67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	63.525.000	43.525.000		6.847.500	6.847.500					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	169.545.512	18.045.000	ZETLIARDO, SE	12.975.000	12.975.000	71,90	7,18	71,90	80,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	169.545.512	18.045.000		12.975.000	12.975.000					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	38.500.000	19.250.000	ZETLIARDO, SE	16.270.000	16.270.000	84,52	35,44	84,52	90,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	38.500.000	19.250.000		16.270.000	16.270.000					
	12. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	19.266.350	6.214.250	NOFRIYENTI, S.Sos	6.214.250	6.214.250	100,00	13,18	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	19.266.350	6.214.250		6.214.250	6.214.250					
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	580.155.580	375.119.700		139.453.833	139.453.833					
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	41.000.000	-	FERI CANDRA, S.Kom	-	-	-	-	-	-	
	a. Belanja Modal	41.000.000			-	-					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH DANA SETELAH PERGESERAN	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)				KET.
						REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	187.847.080	62.002.500	ZETLIARDO, SE	26.002.500	26.002.500	41,94	10,65	41,94	75,00		
	a. Belanja Pegawai	50.700.000	48.000.000		12.000.000	12.000.000						
	b. Belanja Barang dan Jasa	137.147.080	14.002.500		14.002.500	14.002.500						
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	351.308.500	313.117.200	ZETLIARDO, SE	113.451.333	113.451.333	36,23	25,95	36,23	41,67		
	a. Belanja Pegawai	42.000.000	42.000.000		10.500.000	10.500.000						
	b. Belanja Barang dan Jasa	309.308.500	271.117.200		102.951.333	102.951.333						
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	34.800.000	22.500.000		13.500.000	13.500.000						
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	34.800.000	22.500.000	FERI CANDRA, S.Kom	13.500.000	13.500.000	60,00	38,79	60,00	85,00		
	a Belanja Barang dan Jasa	34.800.000	22.500.000		13.500.000	13.500.000						
IV.	PROGRAM SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	2.892.331.850	1.333.182.180		484.535.850	484.535.850						
	1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong saluran Pembuangan	169.732.940	169.732.940	ANHAVON, ST	-	-	-	-	2,50	12,50		
	a. Belanja Pegawai	7.200.000	7.200.000		-	-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	162.532.940	162.532.940		-	-						
	2. Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong saluran Primer Pembuangan	2.695.657.000	1.155.237.340	ANHAVON, ST	476.323.950	476.323.950	41,23	2,80	32,63	49,17		
	a. Belanja Pegawai	8.400.000	4.800.000		2.400.000	2.400.000						
	b. Belanja Modal	2.687.257.000	1.150.437.340		473.923.950	473.923.950						
	3. Penyusunan Sistem Informasi / Database Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan	26.941.910	8.211.900	NADIR	8.211.900	8.211.900	100,00	13,97	100,00	100,00		
	a. Belanja Pegawai	6.000.000	500.000		500.000	500.000						
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.941.910	7.711.900		7.711.900	7.711.900						
V.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	125.000.000	150.498.000		111.498.000	111.498.000						
	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat	125.000.000	150.498.000	HARIS, ST	111.498.000	111.498.000	74,09	89,20	74,09	85,00		
	a. Belanja Pegawai	12.000.000	4.000.000		-	-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	113.000.000	146.498.000		111.498.000	111.498.000						
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	31.657.043.630	23.325.422.480		1.601.796.583	1.601.796.583						
	1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.638.280.000	1.932.282.640	PUSRIAL, ST	631.912.960	631.912.960	32,70	4,50	47,44	74,06		
	a. Belanja Pegawai	56.485.000	56.485.000		20.165.000	20.165.000						
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.581.795.000	1.875.797.640		611.747.960	611.747.960						
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.598.813.980	2.169.013.980	AGUSMAN, ST	520.819.990	520.819.990	24,01	1,78	24,67	52,50		
	a. Belanja Modal	2.598.813.980	2.169.013.980		520.819.990	520.819.990						
	3. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	6.506.462.000	13.047.980	JOKO PRIHANTORO, ST	13.047.980	13.047.980	100,00	0,47	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	6.506.462.000	13.047.980		13.047.980	13.047.980						
	4. Penyusunan Sistem Informasi / Database Pengelolaan Aset Irigasi	294.250.000	825.000	JOKO PRIHANTORO, ST	825.000	825.000	100,00	6,54	100,00	100,00		
	a. Belanja Pegawai	7.800.000			-	-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	286.450.000	825.000		825.000	825.000						

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH DANA SETELAH PERGESERAN	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	REALISASI FISIK (%)			KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	12
5.	Komisi Irigasi	35.475.000	1.950.510	SUHERMAN, ST	1.950.510	1.950.510	100,00	5,50	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	35.475.000	1.950.510		1.950.510	1.950.510					
6.	Operasional Irigasi	624.000.000	624.000.000	FERI CANDRA, S.Kom	130.000.000	130.000.000	20,83	33,33	20,83	41,67	
	a. Belanja Pegawai	624.000.000	624.000.000		130.000.000	130.000.000					
7.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	780.200.000	780.200.000	JOKO PRIHANTORO, ST	93.313.550	93.313.550	11,96	6,54	14,71	30,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000	7.200.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	773.000.000	773.000.000		93.313.550	93.313.550					
8.	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)	17.591.016.650	17.249.044.650	SUHERMAN, ST	195.852.733	195.852.733	1,14	21,88	23,01	30,56	
	a. Belanja Pegawai	70.850.000	59.450.000		7.750.000	7.750.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	885.247.000	554.275.000		55.206.993	55.206.993					
	c. Belanja Modal	16.634.919.650	16.635.319.650		132.895.740	132.895.740					
9.	Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	554.271.000	549.471.000	HARIS, ST	8.487.140	8.487.140	1,54	90,07	90,97	100,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000					
	b. Belanja Modal	547.071.000	547.071.000		6.087.140	6.087.140					
10	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)	34.275.000	5.586.720	JOKO PRIHANTORO, ST	5.586.720	5.586.720	100,00	33,33	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	22.800.000	3.600.000		3.600.000	3.600.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.475.000	1.986.720		1.986.720	1.986.720					
VII.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	461.391.750	243.782.340		27.679.520	27.679.520					
1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.972.000	1.338.660	HARIS, ST	1.338.660	1.338.660	100,00	2,31	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000			-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	14.972.000	1.338.660		1.338.660	1.338.660					
2.	Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	52.744.400	20.418.880	YUSVIANITY, ST, M.Si	20.418.880	20.418.880	100,00	33,33	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	46.744.400	18.418.880		18.418.880	18.418.880					
3	Penyusunan Dokumen Lingkungan	165.353.350	1.752.800	YUSVIANITY, ST, M.Si	1.752.800	1.752.800	100,00	1,05	100,00	100,00	
	a. Belanja Modal	165.353.350	1.752.800		1.752.800	1.752.800					
4	Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	222.322.000	220.272.000	NASIRWAN, SH,ST,M.Hum	4.169.180	4.169.180	1,89	5,77	26,23	43,33	
	a. Belanja Pegawai	16.800.000	16.800.000		4.000.000	4.000.000					
	b. Belanja Modal	205.522.000	203.472.000		169.180	169.180					
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	4.064.933.970	1.986.064.380		525.225.810	525.225.810					
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	3.136.912.400	1.738.692.400	BOY OF SUDARMAN, ST	521.363.240	521.363.240	29,99	3,00	36,13	47,19	
	a. Belanja Pegawai	26.400.000	26.400.000		5.800.000	5.800.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			-	-					
	c. Belanja Modal	3.010.512.400	1.712.292.400		515.563.240	515.563.240					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH DANA SETELAH PERGESERAN	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
						REALISASI REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	436.125.000	245.945.110	BOY OF SUDARMAN, ST	2.435.700	2.435.700	0,99	24,50	49,50	75,00	
	a. Belanja Pegawai	1.700.000	1.700.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	434.425.000	244.245.110		2.435.700	2.435.700					
3	Penyusunan Sistem Informasi/Database Sungai dan Pantai	89.854.320	1.282.000	NADIR	1.282.000	1.282.000	100,00	1,43	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	6.400.000			-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	83.454.320	1.282.000		1.282.000	1.282.000					
4	Perencanaan Pengamanan Muara dan Pantai	385.652.000	144.870	NASIRWAN, SH,ST,M.Hum	144.870	144.870	100,00	0,84	100,00	100,00	
	a. Belanja Modal	385.652.000	144.870		144.870	144.870					
5	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	16.390.250	-								
	a. Belanja Barang dan Jasa	16.390.250			-	-					
IX.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	40.985.000	9.957.643		9.957.643	9.957.643					
1	Pembinaan dan Pengelolaan Aset	40.985.000	9.957.643	FERI CANDRA, S.Kom	9.957.643	9.957.643	100,00	24,30	100,00	100,00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	40.985.000	9.957.643		9.957.643	9.957.643					
J U M L A H		40.735.496.042	28.092.578.373		3.135.200.465	3.135.200.465	11,16	22,50	58,50	69,90	

Painan 04 Mei 2020
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN

