




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

N 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
da_pessel@ymail.com

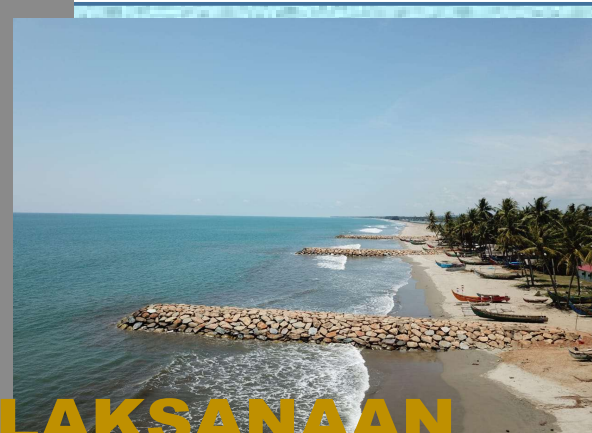

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

BULAN MEI 2020

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN MEI 2020

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Pergeseran (Fisik/Eko)	Pagu Dana Setelah Pergeseran (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
												s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	41.000.000	-	-	-										
	I. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	41.000.000	-	-	-	FERI CANDRA, S.Kom						-	-	-	
	1 Pengukuran Debit Sungai	40.000.000	-	-	-				IV Jurai		PL			-	
	2 Biaya Penunjang	1.000.000	-	-	-						Swk			-	
B.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.865.389.940	2.013.889.940	1.533.309.000	380.000.000										
	I Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Pembuangan	169.732.940	119.732.940	110.000.000	-	ANHAVON, ST						2,50	2,50	12,50	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	160.000.000	110.000.000	110.000.000	-			1 Pkt	Tersebar		Swk	5,00	5,00	15,00	
	2 Biaya Penunjang	9.732.940	9.732.940	-	-						Swk			10,00	
	II. Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan	2.695.657.000	1.894.157.000	1.423.309.000	380.000.000	ANHAVON, ST						32,63	66,97	67,92	
	1 Pembangunan Drainase Kantor Kejaksaan Balai Selasa	380.000.000			-				Ranah Pesisir		Tender			-	
	2 Pembangunan Drainase Kampung Limau Sundai Taratak Panas Pelangai Gadang	-	380.000.000		380.000.000				Ranah Pesisir		Tender			-	
	3 Pembangunan Drainase Saluran Primer Teluk Kualo	191.000.000	189.746.000	189.746.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Air Pura	CV HADI PRATAMA	PL	75,00	100,00	100,00	
	4 Pembangunan Drainase Sianik	191.000.000	189.719.000	189.719.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	IV Jurai	CV SAUDA ANGGUN SARI	PL	36,85	100,00	100,00	
	5 Pembangunan Drainase Pasar Inpres Batang Kapas	677.000.000	-		-				Batang Kapas		Tender			-	
	6 Pembangunan Drainase Sekitar Rumah Dinas Camat Rahul	191.000.000	189.500.000	189.500.000	-		04-04 s/d 02-07-20	1 Pkt	Ranah Ampek Hulu	CV. ARA ABADI	PL	10,00	100,00	100,00	
	7 Pembangunan Drainase Kampung Pasa Malintang Nagari Inderapura Tengah	189.300.000	187.974.000	187.974.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. RAHMA KARYA	PL	45,00	100,00	100,00	
	8 Pembangunan Drainase Perumahan Painan Timur (Lanjutan)	195.600.000	194.268.000	194.268.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. JAVA ANDALAS	PL	80,25	100,00	100,00	
	9 Pembangunan Drainase Pasar Lama	200.000.000	189.759.000	189.759.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	15,00	100,00	100,00	
	10 Pembangunan Drainase Kampung Tengah Simpang Gurun Panjang Utara	150.000.000	141.191.000	141.191.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang	CV AFFAN JAYA	PL	30,00	100,00	100,00	
	11 Pembangunan Drainase Seberang Galundi Surau Anjung Tarusan	100.000.000	-		-				Koto XI Tarusan		PL			-	
	12 Pembangunan Drainase Balah Rambahan Nagari Pungasan	150.000.000	141.152.000	141.152.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. BINTANG SELATAN	PL	95,87	100	100,00	
	13 Biaya Penunjang	80.757.000	90.848.000	-	-						Swk	3,60	3,60	15,00	
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	24.501.673.980	22.754.421.400	5.321.428.303	16.800.056.207										
	I Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.438.280.000	2.232.758.910	2.112.528.000	-	PUSRIAL, ST						48,13	77,00	84,69	
	1 Normalisasi Sungai Batang Lunang	189.000.000	187.927.000	187.927.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lunang	CV. TALANG BALIRIK	PL	32,00	90,00	100,00	
	2 Normalisasi Saluran Koto Pandan - Sawah Bukik	189.000.000	187.925.000	187.925.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Air Pura	CV. FUJUTA	PL	5,00	45,00	60,00	
	3 Normalisasi Saluran Batang Kumbang Gadang	189.000.000							Lunang		PL			10,00	
	4 Normalisasi Saluran Sungai Kuyung Lunang Utara	-	188.124.000	188.124.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lunang	CV. HADY PRATAMA	PL	75,00	90,00	100,00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Alang Rambah	189.000.000							Basa Ampek Balai		PL			10,00	
	6 Normalisasi Saluran Rawang Tobi Pasar Surantih	-	188.050.000	188.050.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. OCY	PL	75,00	100,00	100,00	
	7 Normalisasi Sungai Batang Amping Parak	189.600.000	188.608.000	188.608.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Sutera	CV. ELECTRA GEMILANG	PL	80,00	100,00	100,00	
	8 Normalisasi Saluran Sungai Kampung Koto Kandis Nagari Kambang Timur Lengayang	189.800.000													
	9 Normalisasi Saluran Sungai Padang Panjang I Kambang Utara	-	188.500.000	188.500.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	PL	75,00	100,00	100,00	
	10 Normalisasi Saluran Sungai Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak Tigo Sakato Batang Kapas	141.000.000	139.924.000	139.924.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. KIESSA HABRAH ENGINERING	PL	5,00	100,00	100,00	
	11 Normalisasi Sungai Batang Sei Durian	150.000.000	141.839.000	141.839.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. HAMZA PUTRA	PL	65,00	90,00	100,00	
	12 Normalisasi Sungai Batang Malepang	150.000.000	141.307.000	141.307.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. HAMZA PUTRA	PL	70,00	100,00	100,00	
	13 Normalisasi Sungai Batang Jalamu	200.000.000	-	-	-				Batang Kapas		PL				
	14 Normalisasi Saluran Air Pura	150.000.000							Air Pura		PL			10,00	
	15 Normalisasi Saluran Rimbo Panjang Nag. Tigo Sungai Inderapura	-	141.260.000	141.260.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Air Pura	CV. PUTRA SIKUMBANG	PL	65,00	90,00	100,00	
	16 Normalisasi Sungai Batang Panambam	100.000.000	92.850.000	92.850.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. PUTRA SIKUMBANG	PL	15,00	40,00	50,00	
	17 Normalisasi Sungai Nagari Sei Sirah Air Haji	-	92.462.000	92.462.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. JAYA CONVIDENCE	PL	26,00	85,00	100,00	
	18 Normalisasi Sungai Nagari Air Haji Tengah	100.000.000	-												
	19 Cuci parit kp. Talaut Nag. Muaro Kec. Pancung Soal	50.000.000	44.630.000	44.630.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZAHRA KARYA	PL	95,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Pergeseran (Fisik/Eko)	Pagu Dana Setelah Pergeseran (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
												s/d	s/d	Target s/d	
												bln lalu	bln ini	bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	20 Normalisasi sungai Pinang Sabatang	191.000.000	189.122.000	189.122.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. ARA ABADI	PL	85,00	100,00	100,00	
	21 Biaya Penunjang	70.880.000	120.230.910	-	-						Swk	2,00	2,00	15,00	
	II Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.598.813.980	2.169.013.980	1.605.636.000	435.364.000	AGUSMAN, ST						31,50	77,73	97,27	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Ketaping	188.000.000	188.000.000	187.091.000	909.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Ranah Ampek Hulu	CV. ZEIN KARYA	PL	30,65	95,00	100,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Kubu	188.000.000	188.000.000	187.422.000	578.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Ranah Ampek Hulu	CV. ATTAM KARYA	PL	30,18	85,00	100,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tanjung Kandis	188.000.000	188.000.000	187.236.000	764.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. ALBI SUKSES MANDIRI	PL	30,42	92,00	100,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Titian Patai	94.000.000	194.000.000	-	194.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL			30,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas	188.000.000	188.000.000	187.353.000	647.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAVA ANDALAS	PL	42,00	83,00	100,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Limau Manih	188.000.000	188.000.000	187.314.000	686.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Lengayang	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA	PL	44,30	100,00	100,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bayang Bungo	188.000.000	188.000.000	187.178.000	822.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Bayang	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA	PL	31,00	100,00	100,00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Balarik	540.000.000	-	-	-				Basa IV Balai		Tender			30,00	
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Sumua	188.000.000	188.000.000	187.341.000	659.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. RAYBIL JAYA	PL	31,00	80,00	100,00	
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lauik Kurao	188.000.000	188.000.000	187.321.000	679.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BATANG TARUSAN PERDANA	PL	31,00	70,00	85,00	
	11 Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Baru Batang Kapas	100.000.000	94.000.000	-	94.000.000				Batang Kapas		PL			30,00	
	12 Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Berok Gurun Panjang	150.000.000	141.000.000	-	141.000.000				Bayang		PL			30,00	
	13 Rehab Saluran Irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kecamatan Lengayang	115.000.000	108.000.000	107.380.000	620.000		07-04 s/d 05-07-20	1 Pkt	Lengayang	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	PL	35,10	100,00	100,00	
	14 Biaya Penunjang	95.813.980	128.013.980	-	-						Swk	40,89	50,00	65,00	
	III Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	6.656.462.000	13.047.980	13.047.980	-	JOKO PRIHANTORO, ST						4,21	100,00	100,00	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Tanah Kareh	300.000.000		-	-				Batang Kapas		Tender			-	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tabek Sampudiang	1.200.000.000		-	-				Sutera		Tender			-	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aua	1.701.500.000		-	-				Bayang		Tender			-	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Air Nikek	1.108.700.000		-	-				Basa Ampek Balai		Tender			-	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ambacang	400.000.000		-	-				Lengayang		Tender			-	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Panjang	750.000.000		-	-				Sutera		Tender			-	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang	736.431.000		-	-				IV Jurai		Tender			-	
	8 Pengawas Kegiatan DAK	150.000.000		-	-				Tersebar berdasarkan Fisik		Tender			-	
	9 Biaya Penunjang	309.831.000	13.047.980	13.047.980	-			1 Pkt			Swk	4,21	100,00	100,00	
	IV Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	780.200.000	541.084.880	490.884.880	-	JOKO PRIHANTORO, ST						14,71	24,00	35,00	
	1 OP Daerah Irigasi	730.000.000	490.884.880	490.884.880	-		27-03 s/d 20-09-20	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pessel	Swk	11,50	30,00	40,00	
	2 Biaya Penunjang	50.200.000	50.200.000								Swk	17,91	18,00	30,00	
	V Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program	11.473.647.000	17.249.044.650	570.627.443	16.364.692.207	SUHERMAN, ST						8,96	9,77	12,95	
	(IPDMIP) (LOAN)														
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Agung	3.200.000.000	4.569.100.000	-	4.569.100.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			10,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah	3.200.000.000	4.569.100.000	-	4.569.100.000			1 Pkt	Lunang		Tender			10,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora	3.200.000.000	4.569.100.000	-	4.569.100.000			1 Pkt	Batang Kapas		Tender			10,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II	-	538.785.207	-	538.785.207			1 Pkt	IV Jurai		Tender			10,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian	-	365.280.000	-	365.280.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			10,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian	-	593.227.000	-	593.227.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		Tender			10,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2019	-	437.731.703	437.731.703	-		16-09-19 s/d 23-03-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV BUKIT LANGKISAU	Lanjutan 2019	95,00	100,00	100,00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II (2019)	-	132.895.740	132.895.740	-		16-09-19 s/d 12-02-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. RHANIYA	Lanjutan 2019	95,00	100,00	100,00	
	9 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lubuak Aguang	70.000.000	100.000.000	-	100.000.000			1 Pkt	Lengayang		PL				
	10 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sungai Sirah	70.000.000	100.000.000	-	100.000.000			1 Pkt	Lunang		PL				
	11 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Dwikora	70.000.000	100.000.000	-	100.000.000			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
	12 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT	-	488.600.000	-	488.600.000			1 Pkt			ecatalog				
	13 Pengadaan aksesoris Mobil	-	24.100.000	-	24.100.000			1 Pkt			Pembelian Langsung				
	14 Pengadaan Measuring wheel	-	2.006.000	-	2.006.000			1 Pkt			Pembelian Langsung				
	15 Pengadaan printer	-	14.000.000	-	14.000.000			1 Pkt			ecatalog				
	16 Pengadaan printer multifunction	-	4.250.000	-	4.250.000			1 Pkt			ecatalog				

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Pergeseran (Fisik/Eko)	Pagu Dana Setelah Pergeseran (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
												s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	17 Pengadaan printer portable	-	4.100.000	-	4.100.000			1 Pkt			ecatalog				
	18 Pengadaan Scanner portable	-	5.000.000	-	5.000.000			1 Pkt			ecatalog				
	19 Pengadaan P.C desktop	-	86.114.000	-	86.114.000			1 Pkt			ecatalog				
	20 Pengadaan Notebook	-	43.200.000	-	43.200.000			1 Pkt			ecatalog				
	21 Pengadaan Handphone	-	8.730.000	-	8.730.000			1 Pkt			Pembelian Langsung				
	22 Pembangunan Gedung Sekretariat Komir dan Ruang Rapat Komir	-	180.000.000	-	180.000.000			1 Pkt			PL				
	23 Biaya Penunjang	1.663.647.000	313.725.000	-	-						Swk	7,05	15,00	25,00	
	VI Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	554.271.000	549.471.000	528.704.000	-	HARIS, ST						90,07	90,97	92,86	
	1 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sarasah Sungai Tunu dan D.I Sarasah Sungai Putih	97.000.000	96.684.500	96.684.500	-		29-01 s/d 13-03-20	1 Pkt	Koto XI Tarusan & Bayang	CV. PILARINDO 2010	PL	100,00	100,00	100,00	
	2 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sianik, D.I Koto Rawang dan D.I Sungai Beremas Ampuan	95.500.000	95.293.000	95.293.000	-		29-01 s/d 13-03-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. BALAD INTI SEMESTA	PL	100,00	100,00	100,00	
	3 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tanjung Kandih dan D.I Koto Panjang	100.000.000	99.797.500	99.797.500	-		29-01 s/d 13-03-20	1 Pkt	Sutera & Lengayang	PT. NEBULA GHEINDO CONSULTANT	PL	100,00	100,00	100,00	
	4 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sungai Gemuruh dan D.I Damar Rumput	100.000.000	99.346.500	99.346.500	-		11-02 s/d 26-03-20	1 Pkt	Pancung Soal & Air Pura	CV. MARCHINDO CONSULTANT	PL	100,00	100,00	100,00	
	5 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Koto Durian, D.I Tabek Koto Panjang dan D.I Kapalo Banda	88.500.000	88.324.500	88.324.500	-		11-02 s/d 26-03-20	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. AZZAHRA CONSULTANT	PL	100,00	100,00	100,00	
	6 Revieu DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket A	50.000.000	49.258.000	49.258.000	-		26-02 s/d 26-03-20	1 Pkt	Tersebar	CV. MEDITAMA ENGINEERING CONSULTANT	PL	100,00	100,00	100,00	
	7 Biaya Penunjang	23.271.000	20.767.000								Swk	30,51	36,81	50,00	
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	387.675.350	222.024.800	100.652.800	99.050.000										
	I. Penyusunan Dokumen Lingkungan	165.353.350	1.752.800	1.752.800	-	YUSVIANTY, ST, M.Si						9,23	100,00	100,00	
	1 SPPL Embung Bayang Sani	10.300.000	-	-	-				Bayang		PL				
	2 SPPL Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	46.072.000	-	-	-				Tersebar		PL				
	3 LPPL D.I Sawah Laweh Batang Tarusan Semester I	30.000.000	-	-	-				Koto XI Tarusan		PL				
	4 LPPL Pembangunan Pengamanan Pantai Muaro Kandih Punggasan Semester I	30.000.000	-	-	-				Linggo Sari Baganti		PL				
	5 LPPL Pembangunan Pengamanan Pantai Ampiang Parak Semester I	30.000.000	-	-	-				Sutera		PL				
	6 Biaya Penunjang	18.981.350	1.752.800	1.752.800				1 Pkt			Swk	9,23	100,00	100,00	
	II. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya	222.322.000	220.272.000	98.900.000	99.050.000	NASIRWAN,SH,ST,M.Hum						16,23	26,67	41,67	
	1 SID Embung Solok Sei. Nyalo	100.000.000	98.900.000	98.900.000	-		30-03 s/d 28-07-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. PILARINDO 2010	PL	30,00	50,00	75,00	
	2 SID Embung Sei. Tunu Utara	100.000.000	99.050.000	-	99.050.000				Ranah Pesisir		PL				
	3 Biaya Penunjang	22.322.000	22.322.000								Swk	18,68	30,00	50,00	
		-													
E.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	3.958.689.400	1.955.666.298	1.797.532.728	-										
	I. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	3.136.912.400	1.738.692.400	1.590.544.000	-	BOY OF SUDARMAN, ST						57,80	91,50	95,50	
	1 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Pasar Gompong	470.875.000	-	-	-				Lengayang		Tender				
	2 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sikuai	191.000.000	189.640.000	189.640.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang	CV. NAOMIMO	PL	40,00	65,00	80,00	
	3 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Medan Baik	385.000.000	-	-	-				Lengayang		Tender				
	4 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Salido (Bungo Pasang I)	420.000.000	-	-	-				IV Jurai		Tender				
	5 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Pasir Laweh Taratak Tengah Lumpo IV Jurai	142.250.000	141.680.000	141.680.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. AIKO PRATAMA. E	PL	40,00	100,00	100,00	
	6 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Mesjid Aqsa	185.000.000	183.836.000	183.836.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. BATANG LENGAYANG	PL	60,00	100,00	100,00	
	7 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Tajung Gadang Belakang Mesjid Nurul Islam	190.000.000	188.691.000	188.691.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Sutera	CV. HADI PRATAMA	PL	60,00	100,00	100,00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Surau Pasir Lubuk Nyiur (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	7.005.300	-	-	-				Batang Kapas		PL				
	9 Pengamanan Tebing Sungai Surau Tuik (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	6.992.100	-	-	-				Batang Kapas		PL				
	10 Pengamanan Tebing Sungai Koto Ranah	200.000.000	190.640.000	190.640.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang Utara	CV. MATA AIR	PL	100,00	100,00	100,00	
	11 Pengamanan Tebing Sungai Muaro Air	200.000.000	190.480.000	190.480.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang Utara	CV. MATA AIR	PL	100,00	100,00	100,00	
	12 Pengamanan Tebing Sungai Palo Koto Lubuak Sarik	-	-	-	-				Ranah Pesisir		PL				
	13 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Tanjung Durian Nagari Sungai Tunu Utara	189.000.000	187.691.000	187.691.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. TEKNOS ABADI	PL	60,00	100,00	100,00	
	14 Pengamanan Tebing Sungai Kambang Timur	135.000.000	126.986.000	126.986.000	-		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lengayang	CV. RAZY KAMCA	PL	70,00	100,00	100,00	
	15 Pengamanan Tebing Sungai Batang Lumpo Kp. Sungai Gayo Kec. IV Jurai	200.000.000	190.900.000	190.900.000	-		04-04 s/d 02-07-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. M.K CONTRACTOR	PL	40,00	100,00	100,00	
	16 Biaya Penunjang	214.790.000	148.148.400	-							Swk	8,00	50,00	75,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Pergeseran (Fisik/Eko)	Pagu Dana Setelah Pergeseran (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
												s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	II. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	436.125.000	216.829.028	206.843.858	-	BOY OF SUDARMAN, ST						49,50	49,50	75,00	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali Wilayah I-VII	426.139.830	206.843.858	206.843.858	-		03-04 s/d 31-12-20	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	50,00	50,00	75,00	
	2 Biaya Penunjang	9.985.170	9.985.170	-							Swk	49,00	49,00	75,00	
	III Perencanaan Pengamanan Muara dan Pantai	385.652.000	144.870	144.870	-	NASIRWAN,SH,ST,M.Hum						1,67	100,00	100,00	
	1 DED Pengamanan Muara dan Pantai Karang Labuang Lakitan Utara	377.000.000	-	-	-			1 Pkt	Lengayang		Tender			-	Batal
	2 Biaya Penunjang	8.652.000	144.870	144.870	-						Swk	1,67	100,00	100,00	
	J U M L A H	31.754.428.670	26.946.002.438	8.752.922.831	17.279.106.207			76 Pkt				26,22	58,33	65,38	

Painan, 08 Juni 2020

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESIRIS SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.

NIP. 19641106 199703 1001

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KEADAAN BULAN MEI 2020

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH DANA SETELAH PERGESERAN	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
						REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	878.854.262	639.088.050		251.686.495	251.686.495					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.800.000	70.800.000	FERI CANDRA, S.Kom	19.624.295	19.624.295	27,72	21,64	27,72	50,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.800.000	70.800.000		19.624.295	19.624.295					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	335.222.500	335.222.500	NOFRIYENTI, S.Sos	99.200.000	99.200.000	29,59	22,52	29,59	50,00	
	a. Belanja Pegawai	333.600.000	333.600.000		99.200.000	99.200.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.622.500	1.622.500		-	-					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46.989.000	34.989.000	NOFRIYENTI, S.Sos	12.693.500	12.693.500	36,28	30,56	36,28	50,00	
	a. Belanja Pegawai	36.000.000	24.000.000		8.000.000	8.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.989.000	10.989.000		4.693.500	4.693.500					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.700.000	12.100.000	FERI CANDRA, S.Kom	7.350.000	7.350.000	60,74	50,00	60,74	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.700.000	12.100.000		7.350.000	7.350.000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.095.900	46.268.300	FERI CANDRA, S.Kom	35.010.450	35.010.450	75,67	72,79	75,67	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	58.095.900	46.268.300		35.010.450	35.010.450					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.160.000	19.624.000	FERI CANDRA, S.Kom	8.247.500	8.247.500	42,03	37,22	42,03	50,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.160.000	19.624.000		8.247.500	8.247.500					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.550.000	24.550.000	ZETLIARDO, SE	21.689.000	21.689.000	88,35	84,48	88,35	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	24.550.000	24.550.000		21.689.000	21.689.000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000	8.500.000	NOFRIYENTI, S.Sos	5.565.000	5.565.000	65,47	35,32	65,47	75,00	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	9.500.000	8.500.000		5.565.000	5.565.000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	63.525.000	43.525.000	ZETLIARDO, SE	6.847.500	6.847.500	15,73	7,75	15,73	50,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	63.525.000	43.525.000		6.847.500	6.847.500					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	169.545.512	18.045.000	ZETLIARDO, SE	12.975.000	12.975.000	71,90	7,18	71,90	80,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	169.545.512	18.045.000		12.975.000	12.975.000					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	38.500.000	19.250.000	ZETLIARDO, SE	16.270.000	16.270.000	84,52	35,44	84,52	90,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	38.500.000	19.250.000		16.270.000	16.270.000					
	12. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	19.266.350	6.214.250	NOFRIYENTI, S.Sos	6.214.250	6.214.250	100,00	13,18	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	19.266.350	6.214.250		6.214.250	6.214.250					
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	580.155.580	349.595.250		154.567.833	154.567.833					
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	41.000.000	-	FERI CANDRA, S.Kom	-	-	-	-	-	-	
	a. Belanja Modal	41.000.000	-		-	-					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH DANA SETELAH PERGESERAN	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
						REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	187.847.080	62.002.500	ZETLIARDO, SE	30.002.500	30.002.500	48,39	10,65	48,39	75,00	
	a. Belanja Pegawai	50.700.000	48.000.000		16.000.000	16.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	137.147.080	14.002.500		14.002.500	14.002.500					
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	351.308.500	287.592.750	ZETLIARDO, SE	124.565.333	124.565.333	43,31	25,95	43,31	50,00	
	a. Belanja Pegawai	42.000.000	42.000.000		10.500.000	10.500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	309.308.500	245.592.750		114.065.333	114.065.333					
	III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	34.800.000	13.500.000		13.500.000	13.500.000					
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	34.800.000	13.500.000	FERI CANDRA, S.Kom	13.500.000	13.500.000	100,00	38,79	100,00	85,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	34.800.000	13.500.000		13.500.000	13.500.000					
	IV. PROGRAM SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	2.892.331.850	1.642.101.840		1.334.497.100	1.334.497.100					
	1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong saluran Pembuangan	169.732.940	119.732.940	ANHAVON, ST	-	-	-	2,50	2,50	12,50	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000	7.200.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	162.532.940	112.532.940	112532940	-	-					
	2. Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong saluran Primer Pembuangan	2.695.657.000	1.514.157.000	ANHAVON, ST	1.326.285.200	1.326.285.200	87,59	32,63	66,97	67,92	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000	4.800.000		2.400.000	2.400.000					
	b. Belanja Modal	2.687.257.000	1.509.357.000		1.323.885.200	1.323.885.200					
	3. Penyusunan Sistem Informasi / Database Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan	26.941.910	8.211.900	NADIR	8.211.900	8.211.900	100,00	13,97	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000	500.000		500.000	500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.941.910	7.711.900		7.711.900	7.711.900					
	V. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	125.000.000	150.498.000		130.868.000	130.868.000					
	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat	125.000.000	150.498.000	HARIS, ST	130.868.000	130.868.000	86,96	89,20	86,96	85,00	
	a. Belanja Pegawai	12.000.000	4.000.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	113.000.000	146.498.000		130.868.000	130.868.000					
	VI. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	25.329.673.980	23.386.783.630		4.142.800.761	4.142.800.761					
	1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.638.280.000	2.232.758.910	PUSRIAL, ST	1.379.418.210	1.379.418.210	61,78	48,13	77,00	84,69	
	a. Belanja Pegawai	56.485.000	56.485.000		43.568.160	43.568.160					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.581.795.000	2.176.273.910	2176273910	1.335.850.050	1.335.850.050					
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.598.813.980	2.169.013.980	AGUSMAN, ST	1.170.246.715	1.170.246.715	53,95	31,50	77,73	97,27	
	a. Belanja Modal	2.598.813.980	2.169.013.980		1.170.246.715	1.170.246.715					
	3. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	6.506.462.000	13.047.980	JOKO PRIHANTORO, ST	13.047.980	13.047.980	100,00	4,21	100,00	100,00	
	a. Belanja Modal	6.506.462.000	13.047.980		13.047.980	13.047.980					
	4. Penyusunan Sistem Informasi / Database Pengelolaan Aset Irigasi	294.250.000	825.000	JOKO PRIHANTORO, ST	825.000	825.000	100,00	14,71	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	7.800.000			-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	286.450.000	825.000		825.000	825.000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH DANA SETELAH PERGESERAN	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
						REALISASI REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Komisi Irigasi	35.475.000	1.950.510	SUHERMAN, ST	1.950.510	1.950.510	100,00	5,50	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	35.475.000	1.950.510		1.950.510	1.950.510					
6.	Operasional Irigasi	624.000.000	624.000.000	FERI CANDRA, S.Kom	172.000.000	172.000.000	27,56	33,33	27,56	50,00	
	a. Belanja Pegawai	624.000.000	624.000.000		172.000.000	172.000.000					
7.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	780.200.000	541.084.880	JOKO PRIHANTORO, ST	222.050.050	222.050.050	41,04	14,71	24,00	35,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000	7.200.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	773.000.000	533.884.880	533.884.880	222.050.050	222.050.050					
8.	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)	11.263.647.000	17.249.044.650	SUHERMAN, ST	638.084.436	638.084.436	3,70	8,96	9,77	12,95	
	a. Belanja Pegawai	39.000.000	59.450.000		7.750.000	7.750.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.624.647.000	554.275.000		59.706.993	59.706.993					
	c. Belanja Modal	9.600.000.000	16.635.319.650		570.627.443	570.627.443					
9.	Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	554.271.000	549.471.000	HARIS, ST	539.591.140	539.591.140	98,20	90,07	90,97	92,86	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000					
	b. Belanja Modal	547.071.000	547.071.000		537.191.140	537.191.140					
10	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)	34.275.000	5.586.720	JOKO PRIHANTORO, ST	5.586.720	5.586.720	100,00	33,33	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	22.800.000	3.600.000		3.600.000	3.600.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.475.000	1.986.720		1.986.720	1.986.720					
VII.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	461.391.750	243.782.340		29.879.520	29.879.520					
1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.972.000	1.338.660	HARIS, ST	1.338.660	1.338.660	100,00	2,31	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000			-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	14.972.000	1.338.660		1.338.660	1.338.660					
2.	Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	52.744.400	20.418.880	YUSVIANTY, ST, M.Si	20.418.880	20.418.880	100,00	33,33	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	46.744.400	18.418.880		18.418.880	18.418.880					
3	Penyusunan Dokumen Lingkungan	165.353.350	1.752.800	YUSVIANTY, ST, M.Si	1.752.800	1.752.800	100,00	9,23	100,00	100,00	
	a. Belanja Modal	165.353.350	1.752.800		1.752.800	1.752.800					
4	Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	222.322.000	220.272.000	NASIRWAN, SH,ST,M.Hum	6.369.180	6.369.180	2,89	16,23	26,67	41,67	
	a. Belanja Pegawai	16.800.000	16.800.000		6.200.000	6.200.000					
	b. Belanja Modal	205.522.000	203.472.000		169.180	169.180					
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	4.064.933.970	1.956.948.298		1.456.975.410	1.456.975.410					
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	3.136.912.400	1.738.692.400	BOY OF SUDARMAN, ST	1.453.112.840	1.453.112.840	83,58	57,80	91,50	95,50	
	a. Belanja Pegawai	26.400.000	26.400.000		5.800.000	5.800.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			-	-					
	c. Belanja Modal	3.010.512.400	1.712.292.400		1.447.312.840	1.447.312.840					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH DANA SETELAH PERGESERAN	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
						REALISASI REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	436.125.000	216.829.028	BOY OF SUDARMAN, ST	2.435.700	2.435.700	1,12	49,50	49,50	75,00	
	a. Belanja Pegawai	1.700.000	1.700.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	434.425.000	215.129.028	215.129.028	2.435.700	2.435.700					
3	Penyusunan Sistem Informasi/Database Sungai dan Pantai	89.854.320	1.282.000	NADIR	1.282.000	1.282.000	100,00	1,43	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	6.400.000			-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	83.454.320	1.282.000		1.282.000	1.282.000					
4	Perencanaan Pengamanan Muara dan Pantai	385.652.000	144.870	NASIRWAN, SH,ST,M.Hum	144.870	144.870	100,00	1,67	100,00	100,00	
	a. Belanja Modal	385.652.000	144.870		144.870	144.870					
5	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	16.390.250	-								
	a. Belanja Barang dan Jasa	16.390.250			-	-					
IX.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	40.985.000	9.957.643		9.957.643	9.957.643					
1	Pembinaan dan Pengelolaan Aset	40.985.000	9.957.643	FERI CANDRA, S.Kom	9.957.643	9.957.643	100,00	24,30	100,00	100,00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	40.985.000	9.957.643		9.957.643	9.957.643					
J U M L A H		34.408.126.392	28.392.255.051		7.524.732.762	7.524.732.762	26,50	27,80	65,52	73,88	

Painan, 08 Juni 2020
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

