


KABUPATEN PESISIR SELATAN



FINALL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/12/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/V/2017
TANGGAL : 30 MEI 2017
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR SDN 12 API-API
LOKASI : KECAMATAN BAYANG KAB. PESISIR SELATAN

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYBIL JAYA


PENGAWAS DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2017


FINALL QUANTITY

PEMBUATAN PAGAR SDN 12 API-API

NO	SKETSA / URAIAN PEKERJAAN	ESTIMASI	REKAP VOLUME
I. PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN			
1.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank		20,00 m ³
2.	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	20,00 x 1,00 = 20,00	1,00 ls
II. PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian Tanah Pondasi	(Panjang) 38,90 (Lebar) 0,70 (Tinggi) 0,45 = 12,25 m³	12,25 m ³
2.	Urugan Tanah Kembali	= Dihitung 1/3 dari upah galian	4,08 m ³
III. PEKERJAAN PONDASI			
1.	Pas. Batu Kosong / Anstamping Batu Kali	(Pip) 38,90 (Lbr) 0,70 (Tgt) 0,20 = 5,45 m³	5,45 m ³
2.	Pas. Pondasi Batu Kali	(Pip) 38,90 (Lbr) 0,40 (Tgt) 0,50 = 7,76 m³	7,76 m ³

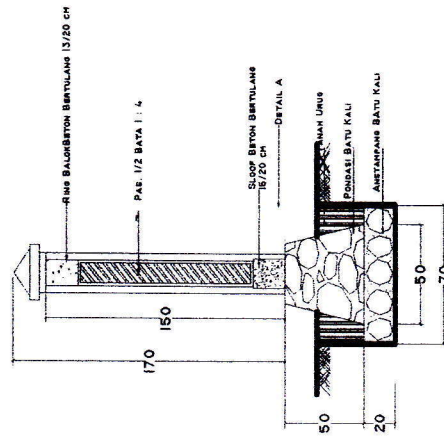

NO		SKETSA / URAIAN PEKERJAAN		PEKERJAAN BETON BERTULANG					ESTIMASI					REKAP VOLUME																																	
														PEKERJAAN BETON BERTULANG																																	
														DETAIL PENJANGKIN BALOK																																	
														<table><tr><td>TYPE BALOK</td><td>LOOF 1500</td><td>BALOK 1000</td><td>LOOF 1525</td></tr><tr><td rowspan="2">PENJANGKIN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40/10</td><td>4/10</td><td>6/10</td></tr><tr><td>TULANGAN UTAMA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BEBEL / ISKOKANS</td><td>D8-150</td><td>D8-150</td><td>D8-150</td></tr></table>					TYPE BALOK	LOOF 1500	BALOK 1000	LOOF 1525	PENJANGKIN				40/10	4/10	6/10	TULANGAN UTAMA				BEBEL / ISKOKANS	D8-150	D8-150	D8-150										
TYPE BALOK	LOOF 1500	BALOK 1000	LOOF 1525																																												
PENJANGKIN																																															
	40/10	4/10	6/10																																												
TULANGAN UTAMA																																															
BEBEL / ISKOKANS	D8-150	D8-150	D8-150																																												
														Pek. Sloof (15 x 20) cm																																	
														Beton Mutu K-175																																	
														Bekisting																																	
														Pembesian																																	
														Tulangan Utama 40/10																																	
														Sengkang Ø8 - 15 cm																																	
														Pek. Kolom (20 x 20) cm																																	
														Beton Mutu K-175																																	
														Bekisting																																	
														Pembesian																																	
														Tulangan Utama 4 Ø 10																																	
														Sengkang Ø8 - 15 cm																																	
														Pek. Balok (15x20) cm																																	
														Beton Mutu K-175																																	
														Bekisting																																	
														Pembesian																																	
														Tulangan Utama 40/10																																	
														Sengkang Ø8 - 15 cm																																	
														Pasangan Angkur dari Sloof ke Pondasi besi Ø 8																																	
														Pasangan Angkur dari Kolom ke Dinding besi Ø 8																																	

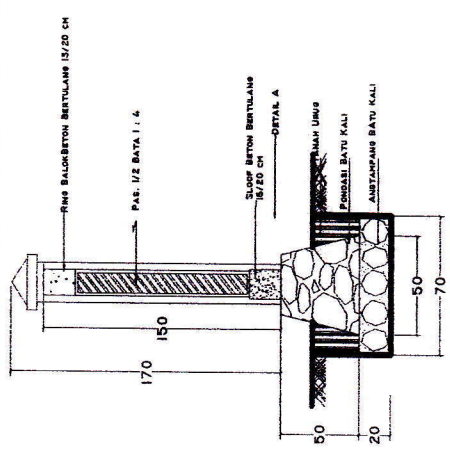NO	SKETSA / URAIAN PEKERJAAN	ESTIMASI	REKAP VOLUME																				
III	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN																						
1.	 Pas. Dinding Bata 1/2 Bata ad. 1 : 4 Luas Bidang Pagar Type 1	<table> <tr> <th>(Lebar)</th><th>(Tinggi)</th><th>(Unit)</th><th>(Luas)</th></tr> <tr> <td>= 2,80 x</td><td>1,10 x</td><td>11,00</td><td>= 33,88 m²</td></tr> <tr> <td>= 1,80 x</td><td>1,10 x</td><td>1,00</td><td>= 1,88 m²</td></tr> <tr> <td>= 3,70 x</td><td>1,10 x</td><td>1,00</td><td>= 4,07 m²</td></tr> <tr> <td colspan="3">Luas Seluruh Bidang Dinding Bata</td><td>39,83 m²</td></tr> </table>	(Lebar)	(Tinggi)	(Unit)	(Luas)	= 2,80 x	1,10 x	11,00	= 33,88 m ²	= 1,80 x	1,10 x	1,00	= 1,88 m ²	= 3,70 x	1,10 x	1,00	= 4,07 m ²	Luas Seluruh Bidang Dinding Bata			39,83 m ²	39,83 m ²
(Lebar)	(Tinggi)	(Unit)	(Luas)																				
= 2,80 x	1,10 x	11,00	= 33,88 m ²																				
= 1,80 x	1,10 x	1,00	= 1,88 m ²																				
= 3,70 x	1,10 x	1,00	= 4,07 m ²																				
Luas Seluruh Bidang Dinding Bata			39,83 m ²																				
2.	Plesteran Pas. Bata 1 : 4 tebal 15 mm	= 39,83 x 2,00	= 79,66 m ²																				
3.	Pek. Acian dan Atwerking Beton	= 79,66 + 38,79	= 118,65 m ²																				
	Atwerking Bidang Beton																						
	Sloof	= 38,30 x 0,40	= 14,52 m ²																				
	Kolom	= 18,50 x 0,50	= 9,75 m ²																				
	Balok	= 38,30 x 0,40	= 14,52 m ²																				
		=	= 38,79 m ²																				
IV	PEKERJAAN CAT																						
1.	Mencat Dinding Tembok Dengan Cat Tembok	= Luas Acian dinding	118,65 m ²																				

PPTK
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kab. Pesisir Selatan


NOERZAL ST
NIP. 19811127 201101 1010

Hengama Lapanjan
Dinas PU dan Pekerjaan Umum, Kab. Pesisir Selatan


LUKMICIA SASTURA
NIP. 19870328 201001 1 007

Penyedia Jasa Pemborong
CV. RAYBL JAYA


EKO OKTAVIANUS NURLI
Direktur
